
DIAGRAMMA COSTI-TEMPI · EARNED VALUE

Nuovo gestionale di magazzino

Dati inventati.

Durata pianificata: **12 mesi** Budget totale (BAC): 120 (Migliaia di euro) Project manager: **Mario Rossi** Azienda: **Logistica Nord S.r.l.**

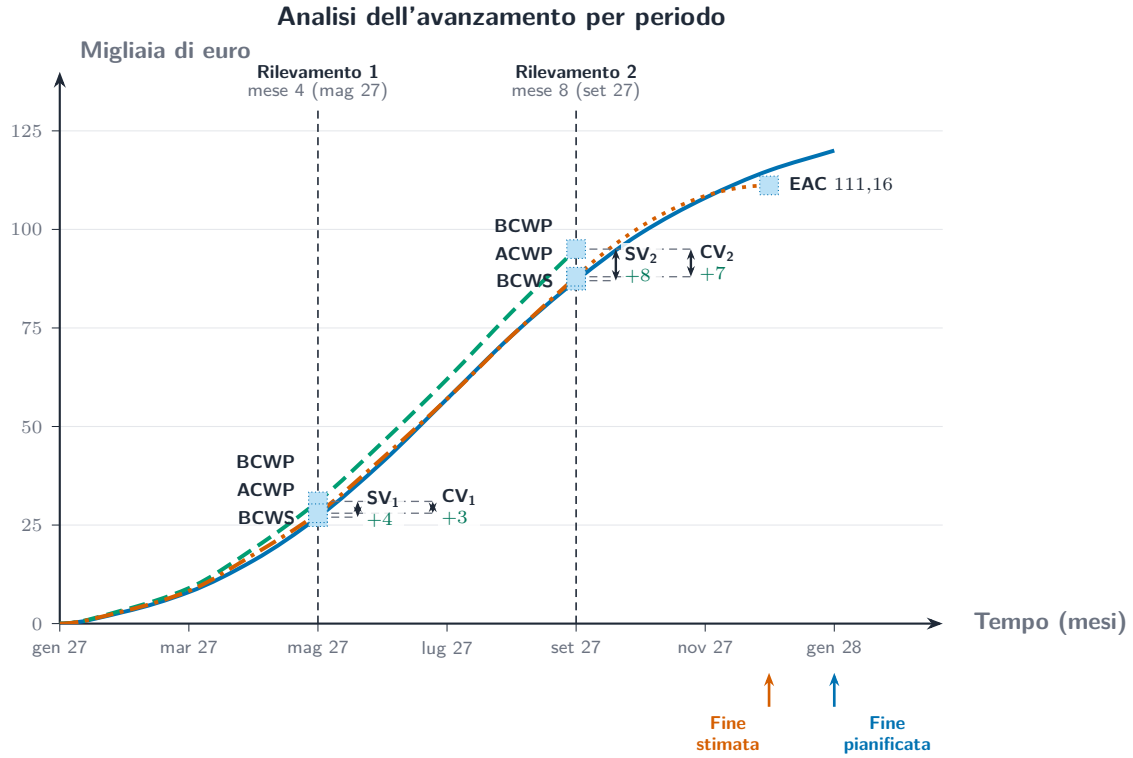

Pianificato a budget (BCWS)
Lavoro svolto a costi di budget (BCWP)
Costo effettivamente sostenuto (ACWP)
Previsione dei costi fino a EAC
CV = BCWP − ACWP (scostamento costi)
SV = BCWP − BCWS (scostamento tempi)
EAC = costo finale stimato

Indicatori ai rilevamenti

	Rilevamento 1 mese 4 (mag 27)	**Rilevamento 2** mese 8 (set 27)
Pianificato a budget (BCWS)	27	87
Lavoro svolto a costi di budget (BCWP)	31	95
Costo effettivamente sostenuto (ACWP)	28	88
CV = BCWP − ACWP	+3	+7
SV = BCWP − BCWS	+4	+8
%CV = CV / BCWS	+11,1 %	+8,0 %
%SV = SV / BCWS	+14,8 %	+9,2 %
CPI = BCWP / ACWP *(assunzione)*	1,11	1,08
SPI = BCWP / BCWS *(assunzione)*	1,15	1,09
Stato	✓ **In linea**	✓ **In linea**

Rilevamento 1 (mese 4 (mag 27)): In anticipo: il lavoro svolto supera il pianificato del 14,8%. Risparmio sui costi del 11,1%.

Rilevamento 2 (mese 8 (set 27)): In anticipo: il lavoro svolto supera il pianificato del 9,2%. Risparmio sui costi del 8,0%.

Previsione *(assunzione, dall'ultimo rilevamento)*: costo finale EAC = 111,16 contro un budget di 120; fine al mese 11,0 contro 12 pianificati.

Legenda dei parametri

BCWS *Budgeted Cost of Work Scheduled* – pianificato a budget (baseline): quanto si doveva spendere fino a quel momento secondo il piano. Il valore finale è il budget totale (BAC).

BCWP *Budgeted Cost of Work Performed* – lavoro svolto a costi di budget (*earned value*): quanto vale, ai prezzi del piano, il lavoro davvero fatto.

ACWP *Actual Cost of Work Performed* – costo effettivamente sostenuto per il lavoro fatto.

CV *Cost Variance* = BCWP − ACWP. Negativa: si è speso più del valore del lavoro svolto (sforamento dei costi).

SV *Schedule Variance* = BCWP − BCWS. Negativa: si è fatto meno lavoro del previsto (ritardo), espresso in denaro.

%CV, %SV %CV(t) = CV(t) / BCWS(t) e %SV(t) = SV(t) / BCWS(t): andamento percentuale nel tempo (formule del libro).

CPI, SPI, EAC *Assunzioni, non nel libro*: CPI = BCWP/ACWP, SPI = BCWP/BCWS, costo finale stimato EAC = BAC/CPI, fine stimata = durata/SPI (ultimo rilevamento), salvo previsione inserita a mano.

Tabella costi-tempi

Periodo	Costo pianificato nel periodo	BCWS cumulato	BCWP	ACWP	CV	SV
1 feb 27	3	3	3,50	3,20	–	–
2 mar 27	5	8	9	8,30	–	–
3 apr 27	8	16	19	17,50	–	–
4 mag 27 **(ril. 1)**	11	27	31	28	+3	+4
5 giu 27	14	41	46	42	–	–
6 lug 27	16	57	62	57	–	–
7 ago 27	16	73	79	73	–	–
8 set 27 **(ril. 2)**	14	87	95	88	+7	+8
9 ott 27	12	99	–	–	–	–
10 nov 27	9	108	–	–	–	–
11 dic 27	7	115	–	–	–	–
12 gen 28	5	120	–	–	–	–

Valori in Migliaia di euro. BCWP e ACWP compaiono nei periodi in cui sono stati rilevati; CV e SV ai rilevamenti (righe evidenziate).

Nota sulle formule

Formule del libro (pagg. 198–199): CV = BCWP − ACWP, SV = BCWP − BCWS, %CV = CV/BCWS, %SV = SV/BCWS. In letteratura la %CV si calcola spesso su BCWP invece che su BCWS: qui si segue il libro. Le curve passano esattamente per i valori inseriti con un'interpolazione cubica monotona (Fritsch–Butland), quindi non scendono mai. Semaforo: *in linea* se CV e SV non sono negativi; *critico* se %CV o %SV sono sotto il -10% (soglia ipotizzata); altrimenti *attenzione*. Documento generato con CostCurve: per cambiare i dati modifica solo la sezione DATI del file .tex e ricompila.
